


Demanda S.I.N. Programada (total semanal): **189,060** MWh

Generación Térmica (MWh)	Por Central	15-sep	16-sep	17-sep	18-sep	19-sep	20-sep	21-sep
Central Battle	43,080							
• Sala B		0	0	0	0	0	0	0
• 5a		1,920	1,920	1,920	1,900	1,900	1,900	1,900
• 6a		2,760	2,760	2,760	2,400	2,400	2,400	2,400
• Motores		1,680	1,680	1,680	1,700	1,700	1,700	1,700
Central La Tablada	0	0	0	0	0	0	0	0
Central P. del Tigre	15,310	1,800	1,080	2,430	2,500	2,500	2,500	2,500
APR		100	0	0	0	0	0	0
Central Maldonado		0	0	0	0	0	0	0
Grupos Diesel		0	0	0	0	0	0	0
Generación Hidráulica (MWh)	Por Central							
C. G. Terra	21,260	3,000	2,360	3,100	3,200	3,200	3,200	3,200
C. Baygorria	12,380	1,685	1,325	1,770	1,900	1,900	1,900	1,900
C. Palmar	52,520	7,920	7,880	7,920	7,200	7,200	7,200	7,200
C. Salto Grande	23,870	1,985	1,925	3,160	4,200	4,200	4,200	4,200
Importación (MWh)	Por País							
Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0
• Contingente		0	0	0	0	0	0	0
Brasil	11,840	1,680	1,680	1,680	1,700	1,700	1,700	1,700
• Rivera		0	0	0	0	0	0	0
• SADI		0	0	0	0	0	0	0
Otros Generadores (MWh)								
UPM + Gen. Distribuida	8,800	1,200	1,200	1,200	1,300	1,300	1,300	1,300
TOTAL S.I.N. (MWh)	189,060	25,730	23,810	27,620	28,000	28,000	28,000	28,000
Exportación (MWh)								
Argentina / Brasil	0	0	0	0	0	0	0	0


EVOLUCION PROGRAMADA de los EMBALSES (Dr. G. Terra, Constitución y Salto Grande)



Represa	Cota Inicial m	Cota Final m
Terra	78.71	78.33
Baygorria	53.86	53.76
Palmar	39.46	38.27
SGU	31.72	31.70

Valores de Referencia (operación normal)

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70.00	80.70
Baygorria	53.00	54.50
Palmar	36.00	40.00
Salto Grande	30.00	35.00




Valores Promedio Semanales (previstos)

Represa	Turbinado m3/s	Aportes m3/s	Vertido m3/s
Terra	630	0	0
Baygorria	648	0	0
Palmar	1,216	0	0
Salto Grande	701	1,264	0

OBSERVACIONES

Las previsiones para la semana indican la presencia de importantes precipitaciones en las cuencas del río Negro e inmediata y media del río Uruguay


DISPONIBILIDAD DE MAQUINAS

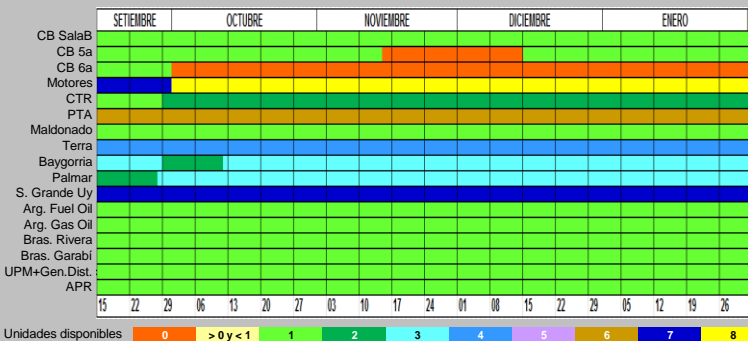

	f. disp. fortuita	f. disp. semana	Unidad (MW)
CB SalaB	0.65	1.00	48
CB 5a	0.7	1.00	75
CB 6a	0.70	1.00	120
Motores	0.85	0.88	10
CTR	0.9	0.50	100
PTA	0.71	1.15	48
Maldonado	0.50	1.00	15
Terra	0.99	0.91	37
Baygorria	0.99	0.94	34
Palmar	0.99	0.65	109
S. Grande Uy	0.99	0.98	133
Arg. Fuel Oil	1.00	1.30	130
Arg. Gas Oil	1.00	0.39	78
Bras. Rivera	0.90	1.00	70
Bras. Garabí	0.00	1.00	280
UPM+Gen. Dist.	0.90	1.00	63
APR	0.95	1.00	24


OBSERVACIONES

Mant. progr. 6a Unidad de C. Battle será desde el 1/10/2012 al 31/1/2013.
 Mant. progr. 5a unidad de central Battle (lavado químico) será desde el 15/11/12 al 14/12/12.
 CTR 1 seguiría indisponible por lo menos hasta el 1/10 por problema detectado en la aislación del rotor.
 Para esta semana, se contará con aprox. 70 MW de Brasí las 24 hs, por la convertora de Rivera, a 167 USD/MWh.
 No se importará energía en modalidad contingente desde Argentina.
 Se prevé que el motor 7 de central battle continúe indisponible hasta 30/9
 Mantenimientos para Unidad 3 de PAL, segunda quincena de septiembre. Unidad 2 de BAY primera quincena de octubre.

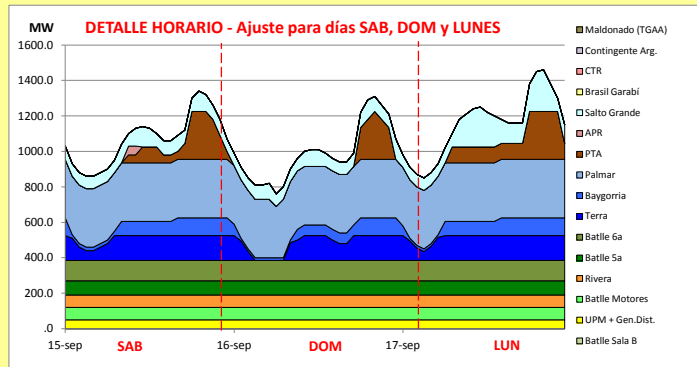

Generación Térmica (MWh)		Por Central	15-sep	16-sep	17-sep
Central Battle		19,080			
• Sala B			0	0	0
• 5a			1,920	1,920	1,920
• 6a			2,760	2,760	2,760
• Motores			1,680	1,680	1,680
Central La Tablada		0	0	0	0
Central P. del Tigre		5,310	1,800	1,080	2,430
APR		100	100	0	0
Central Maldonado		0	0	0	0
Grupos Diesel		0	0	0	0
Generación Hidráulica (MWh)		Por Central			
C.G. Terra		8,460	3,000	2,360	3,100
C. Baygorria		4,780	1,685	1,325	1,770
C. Palmar		23,720	7,920	7,880	7,920
C. Salto Grande		7,070	1,985	1,925	3,160
Importación (MWh)		Por País			
Argentina		0			
• Contingente			0	0	0
Brasil		5,040			
• Rivera			1,680	1,680	1,680
• SADI			0	0	0
Otros Generadores (MWh)					
UPM + Gen. Distribuida		3,600	1,200	1,200	1,200
TOTAL S.I.N. (MWh)		77,160	25,730	23,810	27,620
Exportación (MWh)					
• Exportación a Arg.			0	0	0
• Exportación a Brasil			0	0	0

PRECIO SPOT PREVISTO



OBSERVACIONES

- Despacho propuesto semana 38:
- Parque térmico:
 - Se despacha a pleno Motores, 5a y 6a unidades de CB y PTA (para cota de salto 31.7m)
 - Importación:
 - Se despacha la importación por Rivera.
 - Generación hidráulica:
 - Palmar y Terra a pleno
 - Salto Grande cierra demanda

APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS PROGRAMADOS - DETALLE

PREVISION DE LLUVIAS (Jueves 9/8)

